PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE SANTÉ (PMNS) · PROVINCE DU KWILU · RDC

Services de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) dans la province du Kwilu

Cadre de Performance 2027–2028

Consortium SANRU (chef de file) — ICHESS — FONLIV — FDSS

Maître d'ouvrage	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP)
Bailleur / Unité de gestion	Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé (PMNS) — UG-PDSS
Référence du marché	DP N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS — Formulaire TECH-4
Document de référence	Plan de Suivi-Évaluation 2027-2028 (Livrable 1), sections 6 et 8
Période couverte	Année 1 : janvier – décembre 2027 · Année 2 : janvier – décembre 2028
Version	1.0 — version soumise pour validation
Date de rédaction	Novembre 2026
Auteur	Responsable S&E/HMIS du consortium, avec l'appui d'un expert senior en santé publique et suivi-évaluation

Ce cadre de performance est la déclinaison opérationnelle et synthétique du Plan de Suivi-Évaluation. Il en reprend les indicateurs et les cibles sans en modifier la teneur. Toute donnée absente de Tech-4 est signalée par la mention « [À compléter selon Tech-4] ».

Table des matières

Objet et mode d'emploi . . . 3
1.1 Ce que contient ce document . . . 4
1.2 Comment lire les cibles . . . 4
1.3 Le code couleur . . . 4
1.4 Articulation avec les autres documents . . . 5
Matrice de performance globale . . . 6
2.1 Matrice des indicateurs clés de performance . . . 7
2.2 Lecture de la matrice . . . 8
Tableau de bord synthétique . . . 9
3.1 Positionnement au démarrage . . . 10
3.2 Cibles semestrielles et suivi trimestriel . . . 10
3.3 Règles d'actualisation du tableau de bord . . . 11
Matrice de risques liée à la performance . . . 12
4.1 Matrice des risques . . . 13
4.2 Hiérarchisation et pilotage des risques . . . 14
Échéancier des jalons de performance . . . 15
5.1 Jalons trimestriels 2027-2028 . . . 16
5.2 Points de non-retour . . . 16
Gouvernance du cadre de performance . . . 18
6.1 Rôles et responsabilités . . . 19
6.2 Règles de mise à jour . . . 19
6.3 Ce que ce cadre ne remplace pas . . . 19

01

Objet et mode d'emploi

À quoi sert ce cadre, qui l'utilise et comment il se lit

Le présent Cadre de performance est le document de pilotage du projet. Il condense, en quatre tableaux, l'information dont le chef de projet, le comité de pilotage et l'UG-PDSS ont besoin pour savoir, à tout moment, si le projet est sur la bonne voie. Il ne remplace pas le Plan de Suivi-Évaluation : il en extrait les indicateurs de plus haut niveau et les organise en instrument de décision.

1.1 Ce que contient ce document

- **Une matrice de performance globale** (section 02) : douze indicateurs clés, rattachés aux objectifs spécifiques et aux résultats intermédiaires de TECH-4, avec leur valeur de référence, leurs cibles annuelles, leur seuil d'alerte et leur responsable.
- **Un tableau de bord synthétique** (section 03) : la représentation visuelle du positionnement du projet, avec un code couleur à trois niveaux et des cibles semestrielles permettant un suivi trimestriel.
- **Une matrice de risques liée à la performance** (section 04) : les douze risques susceptibles de faire dévier le projet, leur probabilité, leur impact, la stratégie d'atténuation et l'indicateur d'alerte précoce associé.
- **Un échéancier des jalons** (section 05) : les huit trimestres de mise en œuvre, avec la cible cumulative attendue à chaque échéance et la revue prévue.
- **Les règles de gouvernance** (section 06) : qui met à jour le cadre, à quelle fréquence et selon quelles modalités.

1.2 Comment lire les cibles

La même convention que celle du Plan de Suivi-Évaluation est appliquée, afin d'éviter toute ambiguïté sur l'origine d'un chiffre.

Tableau 1. Convention de lecture des cibles et des valeurs

Marque	Signification	Conséquence opérationnelle
Aucune	Cible explicitement chiffrée dans le formulaire TECH-4	La cible est opposable ; tout écart doit être expliqué en revue
(b)	Cible d'alignement sur la référence nationale citée dans TECH-4	La cible de l'année 2 reprend la valeur nationale ; celle de l'année 1 en est le point médian
(c)	Donnée absente de TECH-4	Cible fixée à l'atelier de cadrage de janvier 2027, sur la base de l'enquête de référence
n.d.	Valeur de référence non disponible dans TECH-4	La référence est établie par l'enquête de référence ; aucune cible n'est annoncée avant

1.3 Le code couleur

Le tableau de bord utilise trois couleurs, définies sans ambiguïté afin d'éviter les interprétations divergentes d'une revue à l'autre.

Tableau 2. Définition du code couleur

Code	Signification	Critère d'attribution	Réponse attendue
Vert	Sur la bonne voie	La valeur atteint au moins 90 % de la cible semestrielle, ou l'indicateur est déjà à 66 % ou plus de sa cible annuelle	Aucune action spécifique ; l'indicateur reste sous surveillance
Orange	Attention requise	La valeur atteint entre 60 % et 90 % de la cible semestrielle, ou la donnée n'est pas encore disponible	Analyse causale en revue trimestrielle ; mesure corrective légère
Rouge	En retard	La valeur est inférieure à 60 % de la cible semestrielle, ou l'indicateur est structurellement bloqué	Plan de redressement obligatoire, avec responsable et échéance

1.4 Articulation avec les autres documents

Le cadre de performance s'articule avec trois autres documents du dispositif : le **Plan de Suivi-Évaluation** (Livrable 1), qui contient les 43 indicateurs, les fiches techniques et le calendrier de collecte ; le **rapport trimestriel de performance**, qui renseigne le tableau de bord ; et le **plan d'action de redressement**, qui traduit en décisions les indicateurs passés en orange ou en rouge.

Chacun de ces documents a une fonction distincte, et le cadre de performance ne les duplique pas : il prélève dans le Plan de Suivi-Évaluation la définition de chaque indicateur, il en extrait les valeurs observées pour les confronter aux cibles, et il renvoie au rapport trimestriel le soin d'expliquer les écarts. Une valeur ne doit jamais circuler d'un document à l'autre sans être rattachée à sa source.

Tableau 3. Place de chaque document dans le dispositif de pilotage

Document	Ce qu'il apporte au cadre de performance	Fréquence	Producteur
Plan de Suivi-Évaluation (Livrable 1)	Les 43 indicateurs, leurs fiches techniques, les méthodes et le calendrier de collecte : il fixe la définition de calcul et la source de chaque valeur.	Une fois, puis actualisé en cas de révision	Équipe S&E
Tableau de bord (section 03)	Le positionnement des douze indicateurs clés selon le code couleur, au regard de la cible semestrielle en cours.	Trimestriel	Équipe S&E
Rapport trimestriel de performance	L'analyse causale des écarts, les mesures correctives proposées et les décisions du comité de pilotage.	Trimestriel (J+25)	Coordination du projet
Plan d'action de redressement	Les activités, responsables et échéances permettant de ramener sur trajectoire tout indicateur en rouge.	À chaque indicateur rouge	Responsable de l'indicateur

> ✓ **Une règle simple pour les revues**
> Toute décision prise en revue doit pouvoir se lire dans l'un de ces quatre documents. Une décision qui ne s'y trouve pas n'a pas de trace, et donc pas de suite. C'est cette discipline, plus que la précision des chiffres, qui fait la valeur d'un cadre de performance.

02

Matrice de performance globale

Douze indicateurs clés, leurs cibles et leurs seuils d'alerte

2.1 Matrice des indicateurs clés de performance

Les douze indicateurs retenus couvrent les quatre objectifs spécifiques de TECH-4 et le résultat intermédiaire 4.5 relatif au suivi-évaluation. Ils ont été choisis parce qu'ils sont mesurables avec les instruments existants, qu'ils sont sensibles à l'action du projet à l'échelle d'un trimestre et qu'ils couvrent l'ensemble de la chaîne de résultats.

Tableau 4. Matrice de performance globale du projet (12 KPI)

Objectif	Résultat attendu	Indicateur clé (KPI)	Référence	Cible 2027	Cible 2028	Seuil d'alerte	Fréquence	Responsable
OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation des services NAC améliorés	Nombre de RECO formés au paquet NAC (cumul)	0	4 956	8 314	< 3 500 fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste Nutrition
OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation des services NAC améliorés	Nombre de CAC mises en place ou redynamisées (cumul)	2 250	3 188	3 188	< 2 700 fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste engagement communautaire
OS1	RI 1.2 — Approches innovantes de lutte contre la malnutrition aiguë	Nombre de FARN fonctionnels (Yasa Bonga, Kingandu)	0	30	30	< 20 fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste Nutrition
OS1	RI 1.3 — Qualité des services communautaires	Proportion de FOSA sans rupture d'intrants nutritionnels	0 %	100 %	100 %	< 80 %	Trimestrielle	Spécialiste marchés publics et logistique
OS2	RI 2.1 — Comités locaux de lutte contre les VBG actifs	Nombre de comités locaux VBG actifs	0	10	10	< 7 fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste engagement communautaire / genre
OS2	RI 2.3 — Système de prise en charge des SVS renforcé	Proportion de survivantes de VBG avec prise en charge holistique	1,9 %	25 %	50 %	< 15 % fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste engagement communautaire / genre
OS2	RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées	Nombre de ZS rapportant au moins un cas de VBG dans DHIS2	6 / 10	10 / 10	10 / 10	< 8 ZS	Trimestrielle	Resp. S&E/HMIS
OS3	RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures renforcés	Proportion de villages couverts par une CAC fonctionnelle	71 %	100 %	100 %	< 85 % fin 2027	Trimestrielle	Spécialiste engagement communautaire
OS3	RI 3.2 — Leadership et capacités managériales locales	Proportion de CAC disposant d'un plan d'action communautaire	16 %	23 %	30 %	< 20 % fin 2027	Semestrielle	Spécialiste engagement communautaire
OS4	RI 4.1 — Offre et utilisation des services de nutrition en FOSA	Proportion de FOSA dotées en équipements et intrants (cumul)	0 %	100 %	100 %	< 70 % fin 2027	Semestrielle	Spécialiste marchés publics et logistique
OS4	RI 4.1 — Offre et utilisation des services de nutrition en FOSA	Taux de prise en charge des enfants MAS référés	n.d.	80 %	80 %	< 60 %	Trimestrielle	Spécialiste Nutrition
OS4	RI 4.5 — S&E, redevabilité et apprentissage assurés	Taux de complétude et de promptitude des rapports DHIS2 (10 ZS)	n.d.	80 %	90 %	< 70 %	Mensuelle	Resp. S&E/HMIS

2.2 Lecture de la matrice

Les indicateurs sont rattachés aux quatre objectifs spécifiques de TECH-4 : **OS1** — mise en œuvre des activités dans les sites communautaires ; **OS2** — sensibilisation aux VBG et prise en charge des victimes ; **OS3** — soutien aux structures de participation communautaire ; **OS4** — appui au système de santé pour la qualité des services de nutrition dans les FOSA. La colonne « Résultat attendu » renvoie au résultat intermédiaire (RI) correspondant.

Trois constats se dégagent de la lecture de cette matrice au démarrage.

- **Cinq indicateurs partent de zéro.** Les RECO formés, les FARN, les comités locaux de lutte contre les VBG, les FOSA sans rupture d'intrants et les FOSA dotées en équipements n'ont aucune valeur de départ : le projet doit construire l'intégralité du résultat. Ces cinq indicateurs sont donc les plus exposés au risque de retard et doivent faire l'objet d'un suivi mensuel interne, indépendamment de la fréquence de reporting trimestrielle.
- **Trois indicateurs disposent d'un acquis mobilisable.** La couverture des villages en CAC (71 %), la proportion de CAC disposant d'un plan d'action (16 %) et le nombre de zones rapportant des cas de VBG (6 sur 10) s'appuient sur des dispositifs existants. Le projet consolide plus qu'il ne crée, ce qui autorise des cibles de fin d'année 1 plus ambitieuses.
- **Deux indicateurs restent sans valeur de référence.** Le taux de prise en charge des enfants MAS référés et la complétude des données DHIS2 ne sont pas documentés dans TECH-4. Ils seront renseignés par l'enquête de référence et l'audit initial de qualité des données, au plus tard en mars 2027 ; d'ici là, ils sont maintenus en orange par convention.

> ⚠ **Règle de gestion des seuils d'alerte**
> Un indicateur qui franchit son seuil d'alerte deux trimestres consécutifs est inscrit d'office à l'ordre du jour du comité de pilotage. Cette règle évite que les difficultés persistantes ne se dissolvent dans la routine des revues.

Ce que cette matrice ne dit pas

Douze indicateurs ne résument pas quarante-trois. La matrice retient ceux dont dépend l'atteinte des objectifs ; elle laisse de côté les indicateurs de processus, les indicateurs de qualité de service intermédiaires et les mesures désagrégées. Ces derniers restent suivis au titre du Plan de Suivi-Évaluation et n'apparaissent au tableau de bord que lorsqu'ils éclairent une décision.

Elle ne fixe pas non plus de cible pour les indicateurs marqués (c) : ces cibles dépendront de la mesure de référence et seront arrêtées en atelier, puis intégrées au cadre par voie de révision. D'ici là, la matrice indique la valeur attendue en fin d'année 1 pour les indicateurs comparables, à titre de repère de lecture et non de cible contractuelle.

03

Tableau de bord synthétique

Positionnement visuel des indicateurs et cibles semestrielles

3.1 Positionnement au démarrage

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque indicateur, la valeur de référence confrontée à la cible de l'année 1. La longueur de la jauge mesure le chemin déjà parcouru ; le repère vertical bleu foncé marque la cible à atteindre.

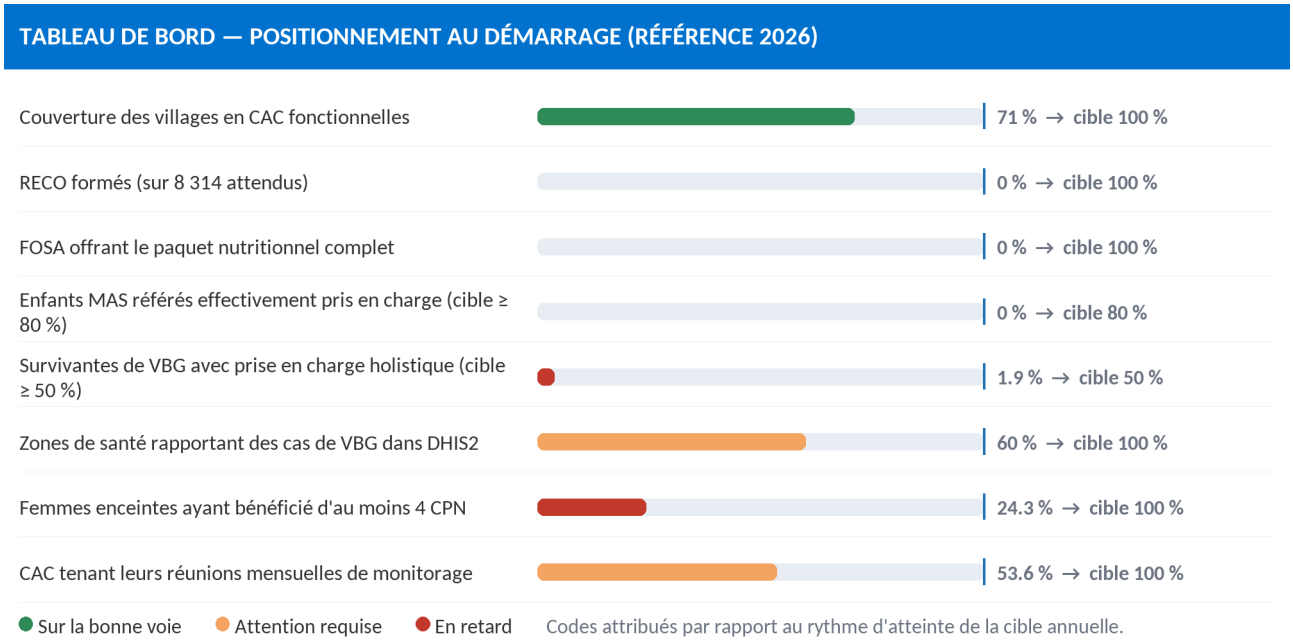


Figure 1. Tableau de bord du projet au démarrage — écart entre la situation de référence et la cible 2027

Le code couleur du graphique exprime le chemin restant à parcourir au démarrage : vert lorsque la référence couvre déjà au moins deux tiers de la cible, orange entre un tiers et deux tiers, rouge en deçà du tiers. Il est actualisé à chaque revue trimestrielle.

3.2 Cibles semestrielles et suivi trimestriel

Les cibles annuelles sont ventilées en cibles semestrielles, de manière à permettre un suivi tous les trois mois. La ventilation retenue est progressive : elle tient compte du calendrier de montée en charge — les formations et les dotations se concentrent sur les deux premiers semestres, les effets sur l'usage des services apparaissent plus tardivement.

Tableau 5. Cibles semestrielles et positionnement des 12 indicateurs clés

Indicateur clé (KPI)	Référence	S1 2027	S2 2027	S1 2028	S2 2028	Statut initial
Nombre de RECO formés au paquet NAC (cumul)	0	2 500	4 956	8 314	8 314	Vert
Nombre de CAC mises en place ou redynamisées (cumul)	2 250	2 700	3 188	3 188	3 188	Vert
Nombre de FARN fonctionnels (Yasa Bonga, Kingandu)	0	15	30	30	30	Rouge
Proportion de FOSA sans rupture d'intrants nutritionnels	0 %	90 %	100 %	100 %	100 %	Rouge
Nombre de comités locaux VBG actifs	0	5	10	10	10	Rouge
Proportion de survivantes de VBG avec prise en charge holistique	1,9 %	12 %	25 %	38 %	50 %	Rouge
Nombre de ZS rapportant au moins un cas de VBG dans DHIS2	6 / 10	8	10	10	10	Orange
Proportion de villages couverts par une CAC fonctionnelle	71 %	85 %	100 %	100 %	100 %	Vert
Proportion de CAC disposant d'un plan d'action communautaire	16 %	20 %	23 %	27 %	30 %	Vert

Indicateur clé (KPI)	Référence	S1 2027	S2 2027	S1 2028	S2 2028	Statut initial
Proportion de FOSA dotées en équipements et intrants (cumul)	0 %	60 %	100 %	100 %	100 %	Rouge
Taux de prise en charge des enfants MAS référés	n.d.	70 %	80 %	80 %	80 %	Orange
Taux de complétude et de promptitude des rapports DHIS2 (10 ZS)	n.d.	75 %	80 %	85 %	90 %	Orange

Statut initial : positionnement au démarrage, calculé sur le rapport entre la valeur de référence et la cible de l'année 1 (vert : au moins deux tiers du chemin déjà parcouru ; orange : entre un tiers et deux tiers, ou donnée non encore disponible ; rouge : moins d'un tiers). Ce statut est actualisé à chaque revue trimestrielle.

3.3 Règles d'actualisation du tableau de bord

Tableau 6. Calendrier et responsabilités d'actualisation

Étape	Contenu	Échéance	Responsable
Collecte	Remontée des données des 10 ZS et des 423 FOSA, saisie et contrôle de premier niveau	J+10 après la fin du trimestre	ECZS, IT, conseillers de zone
Consolidation	Calcul des 12 KPI, comparaison aux cibles semestrielles, attribution du code couleur	J+20	Responsable S&E/HMIS
Validation	Revue de cohérence avec les audits de qualité des données et le MAA	J+25	Chef de projet
Diffusion	Transmission du tableau de bord à l'UG-PDSS et présentation en revue trimestrielle	J+30	Chef de projet
Décision	Plan de redressement pour les indicateurs orange et rouge	Revue trimestrielle	Comité de pilotage

Le délai de trente jours entre la fin du trimestre et la diffusion du tableau de bord n'est pas une marge de confort : il correspond au temps nécessaire pour que les données des 423 FOSA remontent par les IT et les BCZS, soient contrôlées, puis confrontées aux constats des audits de qualité. Un tableau de bord produit plus vite serait un tableau de bord non vérifié.

Le premier exercice complet porte sur le premier trimestre 2027, avec une réserve : l'enquête de référence n'étant close qu'à la fin mars, les valeurs de référence des indicateurs marqués (b) et (c) sont renseignées avec le tableau de bord du deuxième trimestre. D'ici là, ces indicateurs figurent au tableau de bord avec la mention « en attente de vérification » et ne reçoivent pas de code couleur.

04

Matrice de risques liée à la performance

Probabilité, impact, atténuation et indicateurs d'alerte précoce

4.1 Matrice des risques

Les risques ci-dessous sont ceux qui menacent directement l'atteinte des cibles du cadre de performance. Ils sont tous documentés dans TECH-4 ou en découlent directement : rupture d'intrants depuis 2019, enclavement de la province, instabilité des RECO, faible qualité des données, sous-déclaration des VBG, aléas épidémiques et sécuritaires. Chaque risque est associé à un indicateur d'alerte précoce, distinct de l'indicateur de performance : il ne mesure pas le résultat, mais la probabilité que ce résultat ne soit pas atteint.

Tableau 7. Matrice de risques liée à la performance du projet

Risque	Probabilité	Impact	Stratégie d'atténuation	Indicateur d'alerte précoce
Rupture prolongée des intrants nutritionnels (aucune ZS approvisionnée depuis 2019)	Élevée	Majeur	Pré-positionnement des stocks avant le démarrage ; quantification conjointe avec PRONANUT ; contrats-cadres avec fournisseurs ; suivi hebdomadaire des stocks dans les 250 dépôts	Taux de FOSA sans rupture < 80 % ; délai de réapprovisionnement > 30 jours
Détérioration de la situation sécuritaire et des voies d'accès (province enclavée, 95 631 km²)	Moyenne	Majeur	Plan de contingence par sous-bureau (Bandundu, Bulungu, Idiofa, Gungu, Masi-Manimba) ; décentralisation des livraisons ; suivi inter-agences de la sécurité ; recours aux radios pour les activités à distance	Zones inaccessibles > 2 semaines ; annulation de ≥ 3 missions par trimestre
Instabilité et démobilisation des RECO (charge de travail, absence d'incitation)	Élevée	Majeur	Prime de performance mensuelle de 5 USD par RECO ; mise en place des « RECO-Coach » (30 USD/mois) ; financement basé sur la performance communautaire ; dotation en vélos, bottes et imperméables	Taux d'attrition des RECO > 15 % par an ; < 70 % de VAD planifiées réalisées
Mouvement du personnel de santé formé (perte des compétences acquises)	Élevée	Modéré	Clause de stabilité de 2 ans négociée dans la convention DPS–PMNS ; formation en pool et en cascade ; approche « petite dose haute fréquence » pour la formation continue	> 10 % des prestataires formés quittent leur poste dans l'année
Faible qualité des données (complétude, promptitude, fiabilité des dénominateurs)	Élevée	Majeur	Audits de qualité des données trimestriels intégrés au MAA ; TPM semestriel ; dénombrement actualisé par les RECO ; canevas standardisés ; 42 FOSA connectées directement au DHIS2	Complétude DHIS2 < 70 % ; écart TPM/données de routine > 10 points de pourcentage
Sous-déclaration des cas de VBG et maintien des ZS « silencieuses »	Élevée	Majeur	Comités locaux VBG dotés de mécanismes de signalement confidentiels ; lignes vertes ; pairs-éducateurs ; référencement sécurisé ; collaboration avec l'ONG spécialisée et le sous-cluster VBG	≥ 2 ZS sans aucun cas rapporté sur deux trimestres consécutifs
Épidémies (rougeole, choléra) et résurgence de la COVID-19	Moyenne	Majeur	Intégration des mesures de prévention dans toutes les sessions ; EPI disponibles ; réaffectation rapide des activités vers la riposte ; clauses de flexibilité budgétaire	Déclenchement d'une épidémie dans une ZS d'intervention ; suspension des regroupements > 15 jours
Retard de décaissement et de passation des marchés	Moyenne	Majeur	Plan de passation consolidé et anticipé ; seuils d'alerte de consommation budgétaire ; revue mensuelle de la trésorerie ; dialogue trimestriel avec l'UG-PDSS	Taux d'exécution budgétaire < 60 % à mi-parcours ; > 45 jours de retard sur une commande critique
Insuffisance d'appropriation communautaire et des autorités locales	Moyenne	Modéré	Engagement des APA, chefs traditionnels et religieux dès le démarrage ; transformation des CAC en plateformes multisectorielles ; BCP restitués aux communautés ; cadres de concertation	< 50 % des CAC ayant tenu leurs réunions ; absence de réunion du comité de pilotage
Arrêt de l'appui forfaitaire aux groupes de soutien ANJE après 9 mois	Élevée	Modéré	Préparation de la transition dès le 6e mois ; apports en nature des membres ; couplage avec les activités de masse ; suivi de la résilience des groupes	< 50 % des groupes de soutien encore actifs 3 mois après l'arrêt de l'appui
Insuffisance de la coordination multisectorielle (nutrition, WASH, sécurité alimentaire)	Moyenne	Modéré	Appui technique et financier aux réunions de cluster ; revues semestrielles sous l'égide du Gouverneur ; matrice de responsabilités actualisée annuellement	Moins de 3 réunions de cluster sur 4 tenues par an
Biais de mesure et effets saisonniers sur les indicateurs de résultat	Élevée	Modéré	Calendrier de collecte aligné sur les saisons ; triangulation des sources (SMART, MAA, TPM) ; analyse de tendance plutôt que comparaison de points isolés	Variation de plus de 15 points entre deux mesures successives sans explication documentée

4.2 Hiérarchisation et pilotage des risques

Les douze risques se répartissent en trois niveaux de vigilance, qui déterminent la fréquence de suivi.

Tableau 8. Hiérarchisation des risques et fréquence de suivi

Niveau de vigilance	Risques concernés	Fréquence de suivi	Instance
Critique	Rupture d'intrants ; instabilité des RECO ; faible qualité des données ; situation sécuritaire	Mensuelle	Chef de projet et comité de pilotage
Élevé	Mouvement du personnel formé ; sous-déclaration des VBG ; arrêt de l'appui aux groupes de soutien ; biais de mesure et effets saisonniers	Trimestrielle	Revue trimestrielle de performance
Modéré	Épidémies ; retard de décaissement ; appropriation communautaire ; coordination multisectorielle	Semestrielle	Comité de pilotage et revues semestrielles

Risque le plus critique : la rupture d'intrants. TECH-4 indique qu'aucune zone de santé de la province du Kwilu n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019. Ce constat justifie que le taux de FOSA sans rupture soit à la fois un indicateur de performance et l'objet d'un suivi hebdomadaire des stocks dans les 250 dépôts aménagés. Un délai de réapprovisionnement supérieur à trente jours déclenche une alerte formelle auprès de l'UG-PDSS.

Comment la matrice de risques est tenue à jour

- **Deux révisions ordinaires par an**, en janvier et en juillet, arrêtées en comité de pilotage. La probabilité et l'impact de chaque risque sont réexaminés à la lumière des observations du semestre écoulé ; un risque dont l'indicateur d'alerte précoce s'est déclenché est réévalué d'office.
- **Une révision à chaud** dès qu'un risque nouveau apparaît — épidémie, incident sécuritaire, suspension d'un partenaire — ou qu'un risque sort de la liste. L'ajout se fait en revue trimestrielle, avec un responsable désigné dans la séance.
- **Aucun risque ne sort de la matrice parce qu'il est ancien.** Il en sort lorsqu'il est traité, lorsque le contexte qui l'a fait naître a disparu, ou lorsque le projet assume explicitement de le porter sans mesure d'atténuation — décision qui est alors consignée.

> **Risque versus hypothèse**
> Le risque est ce qui peut empêcher d'atteindre une cible ; l'hypothèse est ce que le projet suppose vrai pour que sa théorie du changement fonctionne. Les deux listes ne se recouvrent pas : la matrice ci-dessus ne reprend pas les hypothèses critiques du Plan de Suivi-Évaluation, qui relèvent du raisonnement d'ensemble et non du pilotage trimestriel.

05

Échéancier des jalons de performance

Cibles cumulatives et revues prévues, trimestre par trimestre

5.1 Jalons trimestriels 2027-2028

Les huit jalons ci-dessous constituent les points de contrôle du projet. À chaque échéance, le chef de projet atteste de l'atteinte de la cible cumulative devant le comité de pilotage ; un jalon non atteint déclenche un plan de rattrapage présenté au trimestre suivant.

Tableau 9. Échéancier des jalons de performance (huit trimestres)

Trimestre	Jalon clé	Cible cumulative	Revue prévue
T1 2027	Validation du plan de S&E et du cadre de performance ; lancement de l'enquête de référence	Plan et cadre validés ; protocole de baseline approuvé ; 0 % des cibles physiques engagées	Revue de démarrage avec l'UG-PDSS
T2 2027	Rapport de référence (SMART, CAP, fonctionnalité CAC/CODESA) et dénombrement actualisé	Baseline disponible pour les 43 indicateurs ; 2 500 RECO formés ; 900 CAC redynamisées	Atelier de cadrage des cibles ; revue trimestrielle 1
T3 2027	Évaluation à mi-parcours (exercice 2027) ; montée en charge des FOSA	4 956 RECO formés ; 846 prestataires formés ; 60 % des FOSA dotées ; 15 FARN opérationnels	Revue trimestrielle 2 ; revue semestrielle de la nutrition
T4 2027	Rapport annuel Y1 ; revue annuelle conjointe ; planification glissante 2028	100 % des cibles physiques de l'année 1 atteintes ; 3 188 CAC couvertes	Revue annuelle ; revue trimestrielle 3 ; revue trimestrielle 4
T1 2028	Mise à l'échelle : extension aux 3 358 RECO restants ; consolidation des FARN	6 000 RECO formés ; 25 FARN opérationnels ; 80 % des FOSA sans rupture	Revue trimestrielle 5
T2 2028	Évaluations thématiques (qualité des soins, VBG, FARN) ; deuxième TPM	8 314 RECO formés ; 30 FARN ; 10 comités VBG actifs ; ≥ 38 % de survivantes pris en charge	Revue trimestrielle 6 ; revue semestrielle de la nutrition
T3 2028	Consolidation et préparation de l'évaluation finale	100 % des cibles physiques atteintes ; 90 % de complétude DHIS2	Revue trimestrielle 7
T4 2028	Évaluation finale externe (critères OCDE-CAD) ; rapport final et capitalisation	Rapport d'évaluation finale ; plan de durabilité ; documentation des bonnes pratiques	Revue trimestrielle 8 ; revue annuelle Y2 ; revue semestrielle finale

5.2 Points de non-retour

Trois échéances conditionnent la suite du projet et ne tolèrent aucun glissement.

- **Fin mars 2027 — fin de l'enquête de référence.** Sans elle, les cibles marquées (c) ne peuvent être fixées, et le projet avance sans référence mesurée. C'est la seule échéance dont le report compromet l'ensemble du dispositif de mesure.
- **Fin décembre 2027 — achèvement du paquet de première génération.** Les 4 956 RECO formés, les 846 prestataires formés et la couverture intégrale des 3 188 CAC doivent être acquis à cette date : l'année 2 est consacrée à l'extension et à la consolidation, non à rattraper l'année 1.
- **Septembre 2028 — fin des évaluations thématiques.** Passé cette date, les recommandations ne peuvent plus être mises en œuvre avant la clôture, ce qui priverait l'évaluation finale d'une partie de sa matière.

Ces trois dates ne sont pas des objectifs de performance : ce sont des conditions de validité. Un jalon manqué ne se rattrape pas en accélérant la collecte les mois suivants ; il se rattrape en révisant le calendrier et en assumant la révision devant le bailleur. C'est pourquoi ils figurent ici, alors qu'ils n'apparaissent pas dans la matrice de performance.

Que se passe-t-il si un point de non-retour est manqué ?

1. **Constat en revue.** Le jalon manqué est constaté à la première revue trimestrielle qui suit l'échéance, sur la base du même seuil de preuve que les indicateurs : un livrable déposé, une base de données clôturée, un rapport reçu.
2. **Analyse d'impact sous quinze jours.** L'équipe S&E établit ce que le retard rend impossible : quelles cibles ne peuvent plus être tenues, quels indicateurs perdent leur référence, quelles activités de l'année 2 doivent être décalées.
3. **Décision explicite du comité de pilotage.** Trois options sont instruites : le maintien du calendrier avec un plan de rattrapage daté, la révision des cibles concernées, ou le report assumé de l'activité à l'année suivante. Aucune option n'est retenue par défaut.
4. **Information de l'UG-PDSS.** Toute révision touchant une cible contractuelle est notifiée par écrit et consignée dans le rapport trimestriel, avec sa justification.

Tableau 10. Options instruites en comité de pilotage lorsqu'un jalon est manqué

Option	Ce que cela implique	Qui décide	Trace
Maintien du calendrier	Un plan de rattrapage daté est adopté ; les activités suivantes sont resserrées sans réduction de périmètre. Option retenue lorsque le retard est inférieur à un trimestre.	Comité de pilotage, sur proposition du chef de projet	Plan de rattrapage annexé au rapport trimestriel
Révision de la cible	La cible annuelle concernée est ramenée à un niveau atteignable et la valeur antérieure reste documentée. Toute cible contractuelle ne peut être révisée sans accord écrit.	UG-PDSS, sur demande motivée du consortium	Avenant de cible et note de justification
Report assumé à l'année 2	L'activité est reprogrammée et son budget redéployé. Les indicateurs qu'elle alimente sont marqués comme non mesurables sur l'exercice en cours.	Comité de pilotage et UG-PDSS	Reprogrammation budgétaire et note au bailleur

La règle des trois dates
Un cadre de performance se juge autant sur ce qu'il empêche que sur ce qu'il mesure. En fixant trois échéances non négociables, le projet se donne les moyens de dire tôt ce qui ne sera pas tenu, plutôt que de le découvrir à l'évaluation finale.

06

Gouvernance du cadre de performance

Rôles, mise à jour et articulation avec le Plan de Suivi-Évaluation

6.1 Rôles et responsabilités

Tableau 11. Rôles et responsabilités dans la mise à jour du cadre

Acteur	Responsabilité	Fréquence d'intervention
Responsable S&E/HMIS	Consolide les données, calcule les KPI, attribue le code couleur, produit le tableau de bord	Trimestrielle et à la demande
Chef de projet	Valide le tableau de bord, arbitre les mesures correctives, rend compte à l'UG-PDSS	Trimestrielle
Spécialistes techniques	Vérifient la fiabilité des données de leur domaine et proposent les cibles techniques	Mensuelle
Conseillers de zone et ECZS	Assurent la remontée des données et le premier contrôle de qualité	Mensuelle
Comité de pilotage du consortium	Prend acte de la performance, arbitre les réorientations majeures	Trimestrielle
UG-PDSS	Valide les cibles, reçoit les rapports, autorise les réorientations budgétaires	Trimestrielle et annuelle

6.2 Règles de mise à jour

1. **Les indicateurs ne changent pas en cours d'année.** Un indicateur ne peut être retiré ou remplacé qu'avec l'accord écrit de l'UG-PDSS, sur proposition motivée du comité de pilotage.
2. **Les cibles ne se révisent qu'à deux moments.** À l'issue de l'enquête de référence (mars 2027) pour les cibles marquées (c), et à l'issue de l'évaluation à mi-parcours (octobre 2027) pour un ajustement argumenté des cibles de l'année 2.
3. **Le code couleur est calculé, non négocié.** Il résulte de l'application mécanique du critère de la section 1.3 ; un désaccord sur le statut se règle par la vérification de la donnée, non par la discussion du seuil.
4. **Chaque version du cadre est archivée.** Les versions successives sont conservées avec leur date et le motif de la révision, ce qui permet de reconstituer l'historique de la performance du projet.

6.3 Ce que ce cadre ne remplace pas

Le Cadre de performance est un instrument de pilotage, non un dispositif de preuve. Il ne contient ni les définitions complètes des indicateurs, ni les fiches techniques, ni le calendrier de collecte, ni les modalités d'évaluation : ces éléments figurent dans le Plan de Suivi-Évaluation, auquel il renvoie systématiquement. En cas de divergence entre les deux documents, le Plan de Suivi-Évaluation prévaut.

> ▶ **Trois décisions attendues pour rendre ce cadre opérationnel**
> 1) Validation des douze indicateurs et de leurs cibles par l'UG-PDSS ; 2) Confirmation du calendrier d'actualisation (J+10, J+20, J+25, J+30) avec les ECZS ; 3) Désignation formelle du point focal performance au sein de chaque équipe cadre de zone.
